



DET KONGELIGE DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref.

Vår ref.

Dato

24/287-5

27. juni 2025

Nasjonalt minneste etter 22. juli i regjeringskvartalet – oppdragsbrev

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) ga i mai 2022 KORO i oppdrag å gjennomføre en konkurranse og utvikle et forprosjekt med sikte på å etablere det permanente, nasjonale minneste etter 22. juli 2011 i regjeringskvartalet. I april 2025 kåret juryen Matias Faldbakkens verk «En opprettholdelse» som vinner. KORO sendte forprosjektet til departementet 16. juni 2025.

Arbeidet gjennomføres i to faser. Fase 1 (konkurransfase og forprosjekt) ble avsluttet da KORO i juni 2025 oversendte forprosjektet til DFD. Fase 2 er detaljprosjektering og bygging av minneste.

Det er til og med 1.7.2025 bevilget 14,5 mill. kroner til gjennomføring av konkurranse og utvikling av forprosjekt for minneste over kap. 1530, post 36 Kunstnerisk utsmykning. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2025 vedtok Stortinget en bevilgning på 20 mill. kroner til detaljprosjektering og forberedelser til bygging av minneste, jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 2 sendt til Statsbygg 24. juni. Endelig kostnadsramme for realisering av minneste behandles i forbindelse med statsbudsjettet for 2026.

Forprosjektet

Minneste etableres i grensesnittet mellom nytt 22. juli-senter og nytt regjeringskvartal, og blir en integrert del av byrommet og Johan Nygaardsvolds plass. I oppdraget til KORO i 2022 ble det pekt på at minneste og byromsentreprisen må ses i sammenheng, og at grensesnittet mellom hva som skal bekostes av henholdsvis minneste og prosjekt nytt regjeringskvartal, må defineres i forprosjektet. KORO leverte ferdig forprosjekt 16. juni. KORO forutsetter at tiltak A og D (se illustrasjonen under) dekkes innenfor prosjekt nytt regjeringskvartal (byromsentreprisen).


Postadresse
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo
postmottak@dfd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 59
www.dfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
932 384 469

Avdeling for
departementenes
fellesfunksjoner

Saksbehandler
Ninni Kate Rognli
22 24 70 96

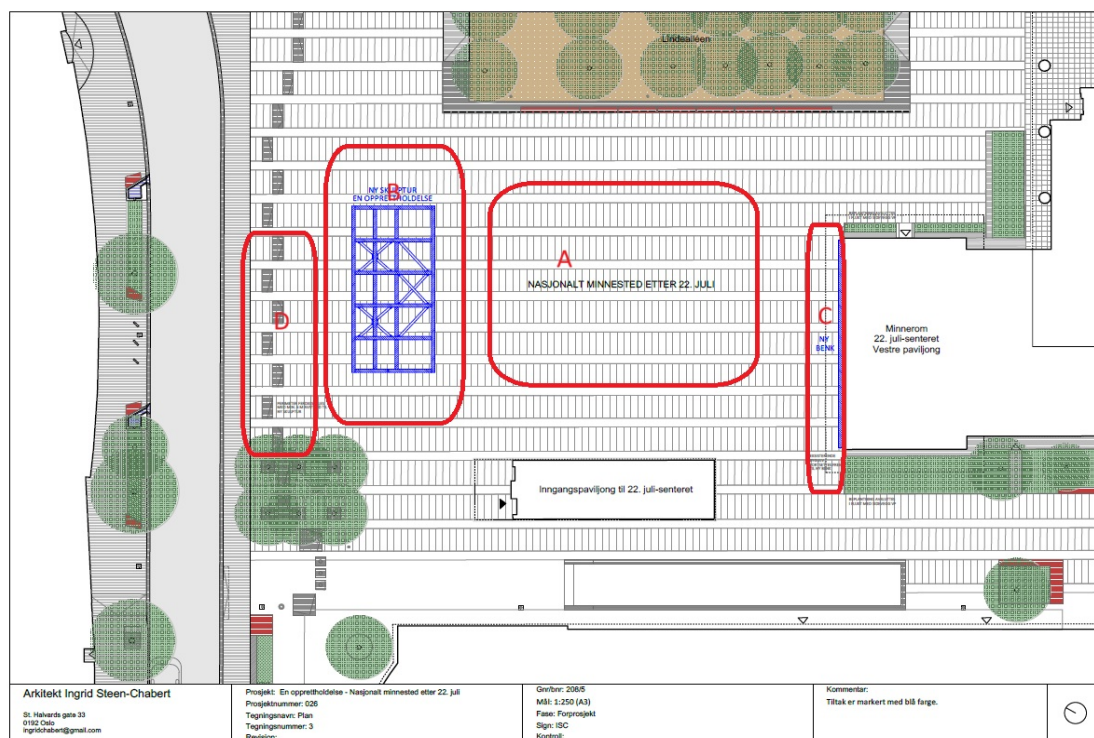

Forklaring til illustrasjonen:

- A: Bygulvet: Nytt bygulv der det var planlagt midlertidig gress og nødvendige tiltak bl.a. knyttet til håndtering av overvann og at utført arbeid må tas opp igjen
- B: Torgskulpturen «En opprettholdelse»
- C: Ca. 20 meter lang sittebenk i (norsk) stein som er en del av minnesteidet
- D: Perimetersikring. På grunn av vektbegrensninger i dekket over 22.juli-senteret foreslår KORO en endring i den etablerte perimetersikringen og planlagt beplantning for å sikre plassdannelse og rom rundt minnesteidet mot Akersgata.

I tillegg foreslås midler til tiltak for å bidra til et best mulig resultat i involveringsprosessen, og for å nå målet om et minnesteid som har høy legitimitet i befolkningen.

Gjennomføringsmodell

DFD har gitt direkte oppdrag til KORO for fase 1: konkurranse og forprosjekt. Departementet ser det som hensiktsmessig at både Statsbygg og KORO gis oppdraget for fase 2, da oppgavene må løses i nært samarbeid for å sikre at erfaringer og kunnskap fra fase 1 videreføres og at minnesteidets kunstneriske integritet ivaretas.

Oppdraget

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet ber Statsbygg og KORO starte detaljprosjektering og forberedelser til bygging av permanent minnesteid etter 22. juli i regjeringsskvartalet, med sikte på ferdigstilling til 15-årsmarkeringen 22. juli 2026.

Oppdraget skal bygge videre på arbeidet i fase 1 og gjennomføres i tråd med overordnet mål og føringer:

Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 er et betydningsfullt sted å samles, minnes og reflektere for oss som samfunn, for alle berørte, og for de som mistet sine nære.

Oppdraget omfatter alle aktiviteter som legger til rette for oppstart av bygging av minnestedet, herunder planlegging, involvering, videreutvikling av prosjektet, oppstart av mosaikkarbeid, fundamentering og øvrige tiltak og tilrettelegging i det tilgrensende byggeprosjektet.

Oppdraget omfatter ikke oppstart av byggingen av minnestedet, dvs. realisering av skulpturen på plassen, men alle øvrige tiltak som er nødvendig for å sikre framdrift og realisering til 15-årsmarkeringen.

DFD anser arbeider i områdene som i forprosjektet omtales som A og D best utføres av byromsentreprisen (K205), og forutsetter at Statsbygg vil komme tilbake til med et kostnadsestimat og fremdriftsplan for disse arbeidene. Arbeidene er forutsatt utført som en del av byggetrinn 1, men etter at man har gått i prøvedrift 1.11.2025.

KORO har, med innspill fra Statsbygg, i forprosjektet skissert en ansvarsdeling mellom KORO og Statsbygg. Departementet ber Statsbygg i samråd med KORO om å vurdere grensesnittet og ansvarsdelingen nærmere og komme tilbake til DFD med en omforent oversikt og gjennomføringsplan for å sikre realisering til sommeren 2026.

I likhet med tidligere fase, jf. overordnet mål og føringer for arbeidet med minnestedet¹, skal det legges vekt på involvering og forankring hos de aktuelle interessentene. KORO er ansvarlig for å videreutvikle minnestedet i dialog med kunstneren.

DFD ber Statsbygg samordne rapportering til DFD for prosjektet fra både Statsbygg og KORO.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet vil etablere et prosjektråd som følger utviklingen i prosjektet tett.

Med hilsen

Aleksander Åsheim (e.f.)
ekspedisjonssjef

Carlo Thomsen
prosjektsjef

¹ [Nasjonalt-minnested-etter-22.-juli-Program-for-forprosjekt Oppdragsbrev mai 2022.pdf](#)
[Nasjonalt minnested i regjeringskvartalet - oppdatert oppdragsbrev juni 2023](#)

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi:

Kultur- og likestillingsdepartementet

Adresseliste

KORO	Postboks 6994 St.	0130	OSLO
	Olavs plass		
Statsbygg	Postboks 232	0103	OSLO
	Sentrum		
